



Číslo smlouvy: 09801180PK/114  
Dotační titul: OPŽP

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**Ing. Hana Chybová**

Sídlo: Brněnská 342/16, 692 01 Mikulov

Zastoupený: Hanou Chybovou

Bankovní spojení: KB Brno, 19-9096170207/0100

IČO: 409 71 384

DIČ: neplátce

*zapsaný v živnostenském rejstříku*

Telefon: +420 774 581 161

E-mail: hana.chybova@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka TAB1.

Specifikace díla je uvedena v příloze č.1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	TAB-2017-002, TAB-2017-003			8 062
2. část	2018	TAB-2018-002, TAB-2018-003			7 055
3. část	2019	TAB-2019-002, TAB-2019-003			7 055
4. část	2020	TAB-2020-002, TAB-2020-003			10 181
5. část	2021	TAB-2021-002, TAB-2021-003			8 023
6. část	2022	TAB-2022-002, TAB-2022-003			6 929
Cena celkem					47 304

Zhotovitel není plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- 3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
- 3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".
- 3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.8.2022.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4 Místem plnění je Česká republika – CHKO Pálava – NPR Tabulová. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

#### V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provádět částí díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

**5.3** Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.

**5.4** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

## **VI. Předání a převzetí částí díla**

**6.1** O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

**6.2** Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

**6.3** V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

## **VII. Odpovědnost za vady**

**7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelům, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

**7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).

**7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

## **VIII. Sankce**

**8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.

**8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

**8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

## **IX. Ukončení smlouvy**

**9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.

**9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

## **X. Poddodavatelé**

**10.1** Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.

**10.2** Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

**10.3** Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

**10.4** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

**11.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

**11.2** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**11.3** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 – mapový zákres,

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 03-08-2017

V Mikulově dne 12.7.2017

Objednatel

RNDr. František Pelc  
ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-14-

Zhotovitel

Ing. HANA  
CHYBOVÁ  
Brněnská 342/16  
692 00 MIKULOV  
IČ: 402 71 384 DIČ: CZ14800029  
Ing. Hana Chybová

Příloha č.1 dílčí zakázka TAB1

**Obecné požadavky na provádění opatření:**

- Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na území Národní přírodní rezervace Tabulová na pozemcích KN 662/1 a 662/11 k.ú. Klentnice
- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016
- Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu
- u níže uvedených činností typu „Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez“ a „Sečení křovinořezem“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací
- náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele
- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

**Likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřez**

**= výchova porostu prořezávkou náletu dřevin do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu, chemická ochrana proti buření ošetřením pařezů herbicidem, štěpkování klestu; zastoupení náletu v podrostu 80%**

Od začátku měsíce září 2017 do konce března 2018 budou z pozemků odstraněny všechna stadia invazních a expanzivních dřevin *Robinia pseudacacia*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo* redukcí biotopu X9B. Z keřového podrostu K3 budou ponechány vhodné druhy dřevin pro podporu druhové skladby L6.1. Odstraněny budou především *Fraxinus excelsior*, *Prunus spinosa*, *Prunus cerasifera*, *Prunus x eminens*, *Swida sanguinea*, *Crataegus sp.*, *Rosa canina*, *Sambucus sp.* apod., budou ponechávány jednotlivé dřeviny či skupiny dřevin různého stáří a zdravotního stavu do 15% původní pokryvnosti podrostu. K ponechání budou vybrány ovocné dřeviny např. *Prunus avium*, *Pyrus pyrastrer*, *Malus sp.* a dále druhy jako *Cornus mas*, *Quercus sp.*, *Euonymus sp.*, *Viburnum sp.*, místy *Ligustrum vulgare* apod., které budou vymezeny zástupcem objednatele před zahájením prací.

Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. V případě snížené únosnosti terénu není možný vjezd mechanizací do chráněného území mimo běžně užívané cesty. Za naprostého sucha či zámrazu lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zachovalé části stepních společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele. Malá část hmoty (do 3,0 prm) z vyřezávek bude využita k tvorbě drobných zhutněných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele (umístění, velikost).

Pařízky budou seřiznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce



ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C .

### **Sečení křovinořezem**

#### **= ožin buřeně**

Ruční sečení křovinořezem či ručně vedenou sekačkou bude prováděna v rámci následné péče o vyřezané plochy s účelem potlačení dalšího šíření nevhodných druhů dřevin a podpory druhové skladby L6.1. Opatření bude prováděno dvakrát v sezonách 2018 a 2019, v letech 2020-2022 bude prováděna v kombinaci s následnou šetrnou aplikací herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin. V obou případech bude mezi jednotlivými opakovanými či navazujícími zásahy časový odstup min. 30 dnů, tzn. druhá seč či aplikace herbicidu budou provedeny nejdříve 30 dnů od dokončení předchozího ručního sečení dle harmonogramu. Přesný termín druhé seče bude upřesněn zástupcem objednatele v závislosti na průběhu vegetační sezony.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin (*Robinia pseudacacia*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*, *Fraxinus excelsior*, *Prunus spinosa*, *Prunus cerasifera*, *Prunus x eminens*, *Swida sanguinea*, *Crataegus sp.*, *Rosa canina*, *Sambucus sp.* apod.), invazních, expanzivních a ruderálních bylin (*Calamagrostis epigejos*, *Solidago canadensis*, *Arrhenantherum elatius*, *Arctium sp.*, *Conium maculatum*, *Urtica dioica* apod.), ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací, ponecháno bude cca 20% z rozlohy zásahu, poměr bude upřesněn v závislosti na vývoji sezony a předchozích provedených zásazích.

V letech 2018 a 2019 bude první seč dokončena vč. úklidu lokality do 30.6., plochy s výskytem *Calamagrostis epigejos*, *Arrhenantherum elatius* budou překoseny před jejich vymetáním nejpozději do 31.5. Druhá seč bude dokončena do 31.8.. V případě nasazení dalšího kvetení *Calamagrostis epigejos*, *Arrhenantherum elatius* budou plochy s jejich výskytem pokoseny před jejich vymetáním. Nepokosené části po prvním sečení zůstanou bez zásahu i při druhé seči. V letech 2020-2022 bude seč vč. úklidu dokončena do 15.7.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dnů po každé seči. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích v MZCHÚ nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd.

### **Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu**

#### **= chemická ochrana proti buření šetrnou aplikací herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin**

Bude provedena šetrná aplikace herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin. Opatření bude prováděno v letech 2020 až 2022 ke konci vegetační sezóny, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci jako navazující zásah na předchozí dokončené ruční sečení, nejdříve však 30 dnů od dokončení ručního sečení, tj. od poloviny července do konce srpna. Postřik kořenových i pařezových výmladků a semenáčů po předchozí vyřezávce a ručním sečení bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován vhodnou technologií (směrový rosič, bodová jehla apod.) výhradně na listy likvidovaných dřevin šetrně k zasažení okolního travního porostu. Na část zmlazení dřevin vhodného druhového složení nebude aplikován herbicid z důvodu podpory biotopu L6.1. Rozsah a konkrétní lokalizace ploch bez aplikace budou určeny při terénní pochůzce se zadavatelem před zahájením prací. Aplikace bude provedena do 31.8., práce však bude převzaty až po viditelném projevení (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) účinků herbicidu, nejpozději do 30.9.



část zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	redukováná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukováné plochy (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
část 1 (rok 2017)	TAB-2017-002	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - výřez	0,1418	0,1344	odstranění náletu (do 10cm průměru kmene na řezné ploše pfeřez) na 80% celkové rozlohy opatření	IX-III (31.3.2018)	20000	2268,8
	TAB-2017-003	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - výřez	0,3621	0,28668	odstranění náletu (do 10cm průměru kmene na řezné ploše pfeřez) na 80% celkové rozlohy opatření	IX-III (31.3.2018)	20000	6793,6
						<b>Celkem č.1</b>		<b>8062,4</b>
část 2. (rok 2018)	TAB-2018-002	Sečení křovinořezem	0,1418	0,1418	ořin buřené celoplošně	V-VII (30.6.2018)	7000	992,6
	TAB-2018-003	Sečení křovinořezem	0,3621	0,3621	ořin buřené celoplošně	V-VII (30.6.2018)	7000	2534,7
	TAB-2018-002	Sečení křovinořezem	0,1418	0,1418	ořin buřené celoplošně	VIII-IX (31.8.2018)	7000	992,6
	TAB-2018-003	Sečení křovinořezem	0,3621	0,3621	ořin buřené celoplošně	VIII-IX (31.8.2018)	7000	2534,7
						<b>Celkem č.2</b>		<b>7054,6</b>
část 3 (rok 2019)	TAB-2019-002	Sečení křovinořezem	0,1418	0,1418	ořin buřené celoplošně	V-VII (30.6.2019)	7000	992,6
	TAB-2019-003	Sečení křovinořezem	0,3621	0,3621	ořin buřené celoplošně	V-VII (30.6.2019)	7000	2534,7
	TAB-2019-002	Sečení křovinořezem	0,1418	0,1418	ořin buřené celoplošně	VIII-IX (31.8.2019)	7000	992,6
	TAB-2019-003	Sečení křovinořezem	0,3621	0,3621	ořin buřené celoplošně	VIII-IX (31.8.2019)	7000	2534,7
						<b>Celkem č.3</b>		<b>7054,6</b>
část 4. (rok 2020)	TAB-2020-002	Sečení křovinořezem	0,1418	0,1418	ořin buřené celoplošně	VI-VII (15.7.2020)	7000	992,6
	TAB-2020-003	Sečení křovinořezem	0,3621	0,3621	ořin buřené celoplošně	VI-VII (15.7.2020)	7000	2534,7
	TAB-2020-002	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	0,1418	0,0709	chemická ochrana proti buření šetrnou aplikací herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 50% plochy dotčené vyřezávkou	VIII (31.8.2020)	30000	2127
	TAB-2020-003	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	0,3621	0,18105	chemická ochrana proti buření šetrnou aplikací herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 50% plochy dotčené vyřezávkou	VIII (31.8.2020)	25000	4526,25
						<b>Celkem č.4</b>		<b>10189,55</b>
část 5. (rok 2021)	TAB-2021-002	Sečení křovinořezem	0,1418	0,1418	ořin buřené celoplošně	VI-VII (15.7.2021)	8000	1134,4
	TAB-2021-003	Sečení křovinořezem	0,3621	0,3621	ořin buřené celoplošně	VI-VII (15.7.2021)	8000	2896,8
	TAB-2021-002	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	0,1418	0,04254	chemická ochrana proti buření šetrnou aplikací herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 30% plochy dotčené vyřezávkou	VIII (31.8.2021)	30000	1276,2
	TAB-2021-003	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	0,3621	0,10863	chemická ochrana proti buření šetrnou aplikací herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 30% plochy dotčené vyřezávkou	VIII (31.8.2021)	25000	2715,75
						<b>Celkem č.5</b>		<b>8023,15</b>
část 6. (rok 2022)	TAB-2022-002	Sečení křovinořezem	0,1418	0,1418	ořin buřené celoplošně	VI-VII (15.7.2022)	10000	1418
	TAB-2022-003	Sečení křovinořezem	0,3621	0,3621	ořin buřené celoplošně	VI-VII (15.7.2022)	10000	3621
	TAB-2022-002	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	0,1418	0,02127	chemická ochrana proti buření šetrnou aplikací herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 15% plochy dotčené vyřezávkou	VIII (31.8.2022)	25000	531,75
	TAB-2022-003	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	0,3621	0,054315	chemická ochrana proti buření šetrnou aplikací herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 15% plochy dotčené vyřezávkou	VIII (31.8.2022)	25000	1357,875
						<b>Celkem č.6</b>		<b>6828,825</b>
						<b>Celkem</b>		<b>47303,825</b>

**Číslo opatření:**  
TAB-2017-002

**Popis:**

Likvidace invazivních  
a expanzivních rostlin - výřezem

□ lokalizace opatření

□ hranice ZCHÚ

□ hranice ochranného pásma

□ pozemky AOPK ČR



NPR Tabulová



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Seřadil: Zdeněk HEJRAL  
Blansko 2016  
Zdroje:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015





# NPR TABULOVÁ

rok 2017

**Číslo opatření:**  
TAB-2017-003

**Popis:**

Likvidace invazivních  
a expanzivních rostlin - výřezem

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR







AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Sestavil: Zdeněk HEJČAL  
Blansko 2016  
Zdroje:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015






**Číslo opatření:**  
TAB-2018-002

**Popis:**  
Sečení křovinořezem (ruční  
sřrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR





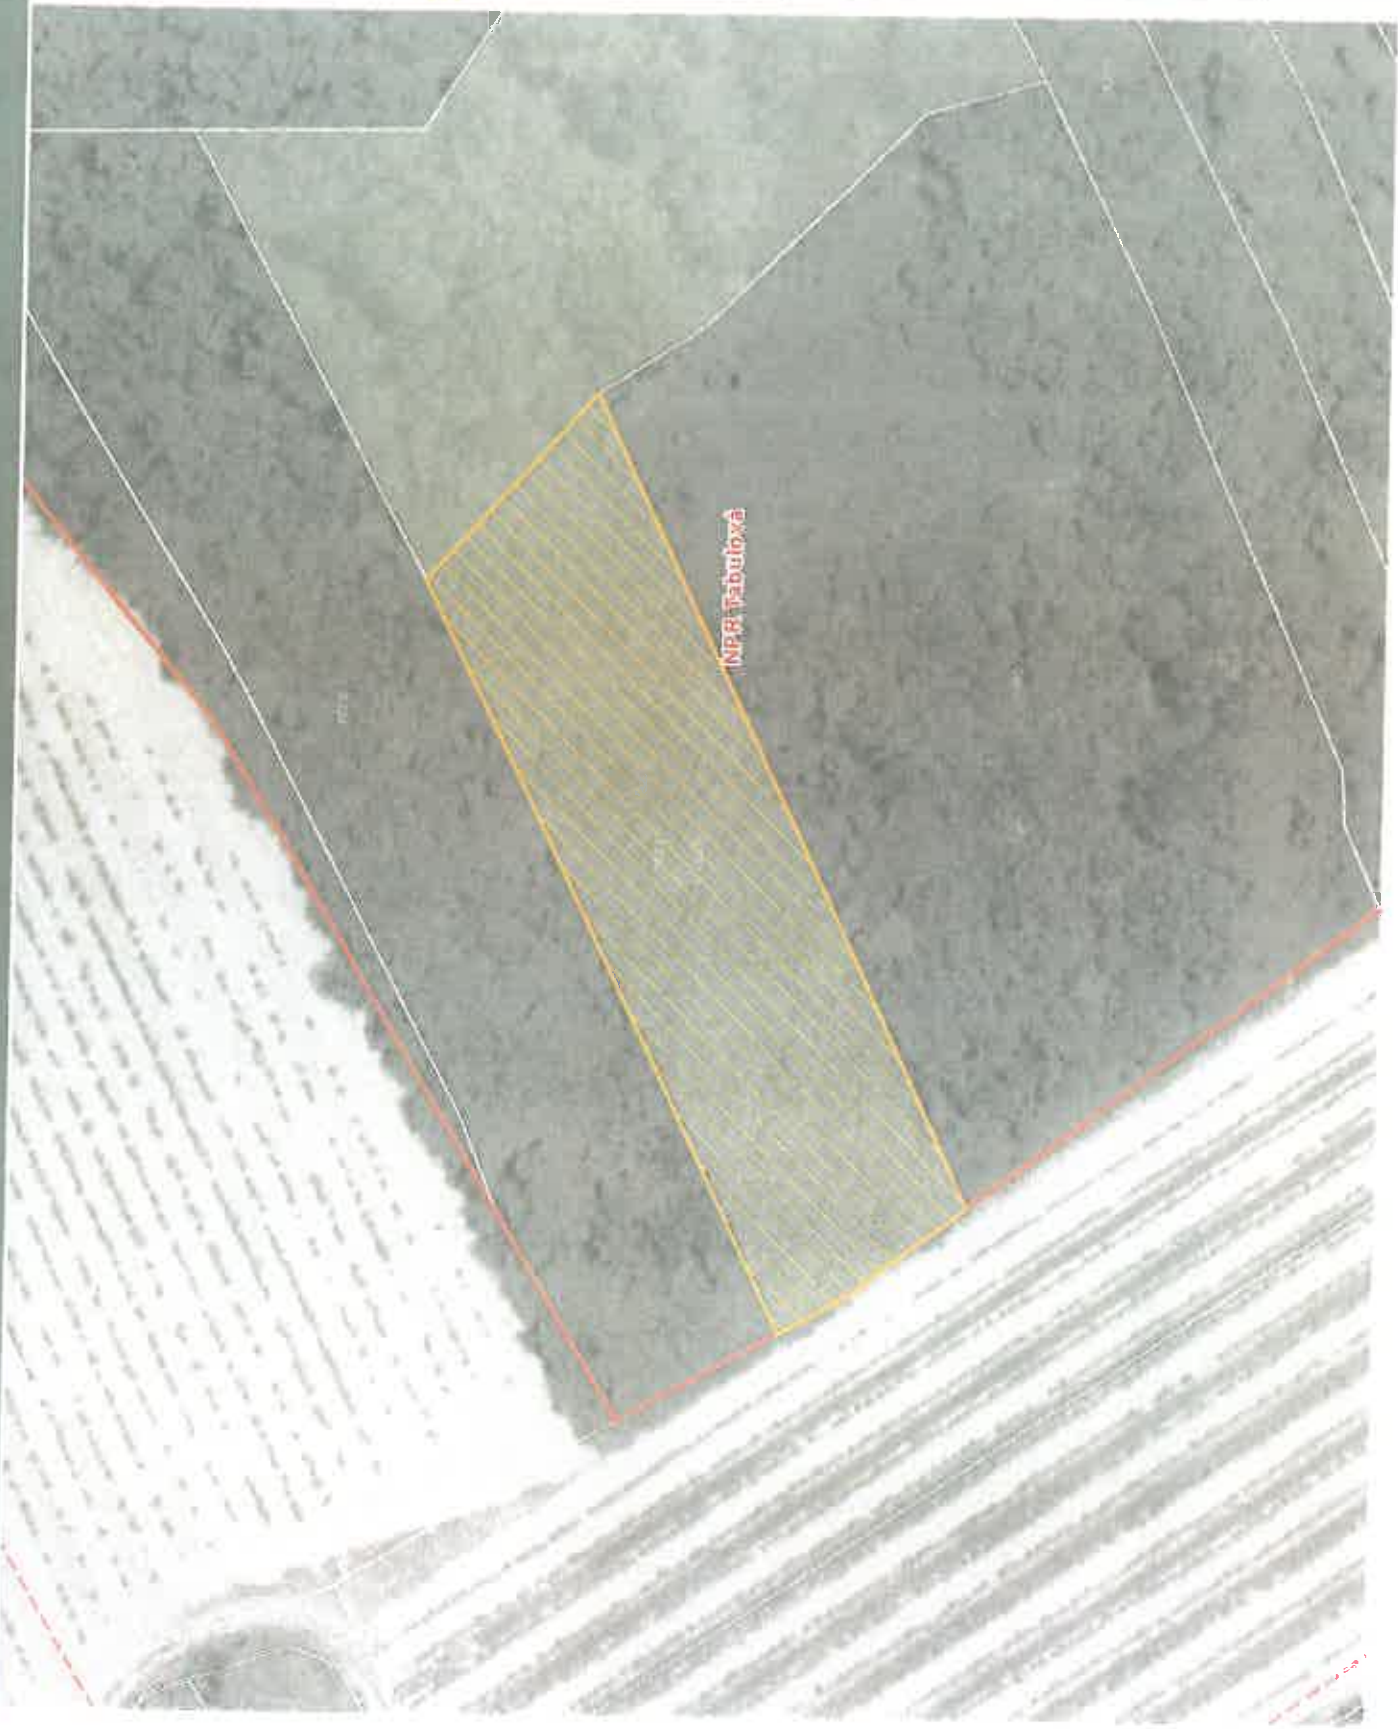

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Sestavil: Zdeněk HEJKA  
Blansko 2018  
Zdroje:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČUZK 2015



Číslo opatření:  
TAB-2018-003

**Popis:**  
Sečení křovinořezem (ruční  
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR







AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Sešlavský Zdeněk HEUKAL  
Blansko 2018  
Zdroje:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČUZK 2015



**Číslo opatření:**  
TAB-2019-002

**Popis:**  
Sečení křovinořezem (ruční  
shrabání a odstranění hmoty)





-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR




AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Sestavil: Zdeněk HEJHAL  
Blansko 2018  
Zároveň:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
artefacto © ČÚZK 2015

**Číslo opatření:**  
TAB-2019-003

**Popis:**  
Sečení křovinořezem (ruční  
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

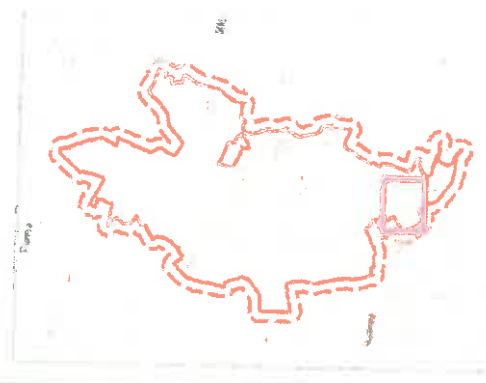

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Sestavič: Zdeněk HEJKA L  
Blansko 2016  
Zdroje:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
autorita © ČUZK 2015









**Číslo opatření:**  
TAB-2020-002

**Popis:**

Sečení křovinofezem (ruční  
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR



NPR Tabulová






AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihní Morava  
Sektar: Zdeněk HEJNAL  
Blansko 2016  
Zdroje: GIS RP Jihní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČUZK 2015

Číslo opatření:  
TAB-2020-003

**Popis:**

Sečení křovinořezem (ruční  
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma  
pozemky AOPK ČR






AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihní Morava  
Seřadit: Zdeněk HEJKA  
Blanský 2016  
Zdroj:  
GIS RP Jihní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015

NBR  
Tabajov



**Číslo opatření:**  
TAB-2021-002

**Popis:**  
Sečení křovinořezem (ruční  
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma  
pozemky AOPK ČR






AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Seřadil: Zdeněk HEJKA L  
Blansko 2016  
Zároveň:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015

NPR Tabulova

**Číslo opatření:**  
TAB-2021-003

**Popis:**

Sečení křovinořezem (ruční  
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma  
pozemky AOPK ČR



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Seřadil: Zdeněk HEJKA  
Blansko 2016  
Zdroje:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015









**Číslo opatření:**  
TAB-2022-002

**Popis:**

Sečení dřeviny (ruční  
sfrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Sestává: Zdeněk H.EJKAL  
Blansko 2016  
Zdroje:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015





NPZ Fabulové




**Číslo opatření:**  
TAB-2022-003

**Popis:**

Sečení dřevinnou (ruční  
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

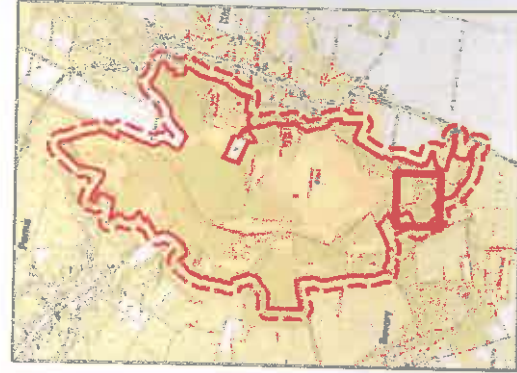

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 31.07.2017 09:15:18

Jméno a příjmení: **Ing. Hana Chybová**  
Datum narození: **19.09.1957**  
Občanství: **Česká republika**  
Sídlo: **Brněnská 342/16, 692 01, Mikulov**  
Identifikační číslo osoby: **40971384**

## *Živnostenské oprávnění č. 1*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,  
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na  
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky  
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Ubytovací služby  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **23.03.1992**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

## *Provozovny k předmětu podnikání číslo*

### *1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

*Obor činnosti: Ubytovací služby*

Adresa: **Brněnská 342/16, 692 01, Mikulov**  
Identifikační číslo provozovny: **1006408452**  
Zahájení provozování dne: **02.02.2017**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Mikulov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.





VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA  
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO  
PROJEKTU EIS: [●]  
- ČÁST [●]

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele: .....

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:**

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

**Stručná charakteristika Části díla:**

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že Část díla<sup>1</sup>

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přejímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:  
.....  
.....  
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.  
Důvod nepřevzetí Části díla:  
.....  
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....  
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ....., - Kč za zhotovení Části díla.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

<sup>1</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO  
PROJEKTU EIS: [●]

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele: .....

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a  
objednatelům dne [●] (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:**

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

**Stručná charakteristika díla:**

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že dílo<sup>1</sup>

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:  
.....  
.....  
Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.  
Důvod nepřevzetí díla:  
.....  
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....  
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ....., - Kč za zhotovení díla.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

<sup>1</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.
