



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: **10380/SOPK/14**
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Otakar Pražák

Sídlo: Sladová 2 Břeclav 69 002

Zastoupený: Otakar Pražák

Bankovní spojení: KB-86-1856930277

IČO: 709 28 517

DIČ:

zapsaný v živnostenském rejstříku: Městský úřad v Břeclavi, obecní živnostenský úřad č.j:

MŽU 670/01/F v Břeclavi dne 29.8.2001

Telefon: 737 458 251

E-mail: ota.les@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka LER_OBNOVA_II.

Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, č. 2 a č. 3, (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	LER-2017-004, LER-2017-006	36 000,-		36 000,-
2. část	2018	LER-2018-004, LER-2018-006	36 000,-		36 000,-
3. část	2019	LER-2019-004	36 000,-		36 000,-
4. část	2020	LER-2020-004, LER-2020-006	36 000,-		36 000,-
5. část	2021	LER-2021-004, LER-2021-006	36 000,-		36 000,-
6. část	2022	LER-2022-004	36 000,-		36 000,-
Cena celkem			216 000,-		216 000,-

Zhotovitel není plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- 3.4** Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 10.12. každého kalendářního roku, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
- 3.5** Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".
- 3.6** Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7** Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1** Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2022.
- 4.2** Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3** Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4** Místem plnění je Česká republika – Národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

- 5.1** Zhotovitel je povinen provádět částí díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2** Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

- 5.3** Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

- 6.1** O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

VIII. Sankce

- 8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.

- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 10.3** Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Příloha č. 3 – mapový zakres

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 17-08-2017

V Břeclavi dne 28.5.2017

Objednatel

Zhotovitel


Otakar Pražák
Nábová 2, Břeclav
IČ: 70928517; DIČ: CZ800120405
Telefon: 737 458 251

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

Otakar Pražák

část zakázky	č.opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	LER-2017-004	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem	1,4572	1,0929	Odstranění náletu do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu a výšky nad 1 m s ponecháním lemu a výsadeb z minulosti. Odstranění náletu proběhne na 75 % plochy opatření. Ruční vyklizování vyřezané hmoty.	IX-III, 31.3.2018	24 704,91	27000
	LER-2017-006	Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou	0,68153	0,340765	Seč na 50 % výměry.	IX-XII, 5.12.2017	26 411,16	9000
						Celkem č.1		36000
část 2. (rok 2018)	LER-2018-004	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem	1,4572	1,4572	Odstranění náletu do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu a výšky do 1 m s ponecháním lemu a výsadeb z minulosti. Odstranění náletu proběhne na 100 % plochy opatření. Ruční vyklizování vyřezané hmoty. Odklizení hmoty do 10 dní po vyřezání	VI-IX, 31.10.2018	18 528,68	27000
	LER-2018-006	Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou	0,68153	0,340765	Křovinořez. Seč na 50 % výměry.	V-X, 31.10.2018	26 411,16	9000
						Celkem č.2		36000
část 3. (rok 2019)	LER-2019-004	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	1,4572	0,3643	postřik na list výmladků za měsíc u přežívajících opakovat, předpoklad výskytu na 25% plochy	V-VII, 31.7.2019	16 469,94	6000
						VIII-X, 31.10.2019	82 349,71	30000
						Celkem č.3		30000
část 4. (rok 2020)	LER-2020-004	Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou + následná aplikace herbicidu	1,4572	1,4572	ruční sečení s odklizením hmoty celoplošně	VII-IX, 30.9.2020	13 724,95	20000
				0,43716	Aplikace herbicidu na list případných výmladků nejdříve 30 dní po seči, předpoklad výskytu zmlazení na 30% plochy dotčené vyřezávkou	X, 31.10.2020	13 724,95	6000
	LER-2020-006	Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou	0,68153	0,340765	Křovinořez. Seč na 50 % výměry.	V-X, 31.10.2020	29 345,73	10000
část 5. (rok 2021)						Celkem č.4		36000
	LER-2021-004	Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou + následná aplikace herbicidu	1,4572	1,0929	Křovinořez, seč na 75 % výměry.	VII-IX, 30.9.2021	18 299,93	20000
				0,32787	Po seči aplikace herbicidu na list případných výmladků nejdříve 30 dní po seči na 30% plochy dotčené vyřezávkou	X, 31.10.2021	18 299,93	6000
	LER-2021-006	Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,68153	0,340765	Křovinořez. Seč na 50 % výměry	V-X, 31.10.2021	29 345,73	10000
část 6. (rok 2022)						Celkem č.5		36000
	LER-2022-004	Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou + následná aplikace herbicidu	1,4572	1,0929	Křovinořez, seč na 75 % výměry.	VII-IX, 30.9.2022	27 449,90	30000
				0,32787	Po seči aplikace herbicidu na list případných výmladků nejdříve 30 dní po seči na 30% plochy dotčené vyřezávkou	X, 31.10.2022	18 299,93	6000
						Celkem č.6		36000
						Celkem		216000

Příloha č. 1 dílčí zakázka „LER-OBNOVA_II“

Obecné požadavky na provádění opatření

- Opatření budou realizována na pozemku parc. č. 2393/1 v k.ú. Lednice na Moravě ve vlastnictví ČR v právním hospodaření pro AOPK ČR. Pozemek se nachází v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Lednické rybníky.
- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016
- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechávané bez zásahu
- u níže uvedených činností typu „likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem“ a „Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací
- náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele
- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem

V letech 2017 a 2018 bude provedena razantní redukce invazních či expanzivních druhů dřevin jako jsou např. *Robinia pseudoacacia*, *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Fraxinus excelsior*, *Prunus spinosa*, *Swida sanguinea*, *Crataegus* sp., *Rosa canina*, *Sambucus* sp. apod. Na ploše však budou ponechávány jednotlivé dřeviny či jejich skupiny různého stáří a zdravotního stavu, zejména v lemu na hranici se zemědělsky obhospodařovanými plochami a záměrná výsadba z minulosti. Poměr ponechaných nekosených částí je uveden ve specifikaci zásahu (tab. Příloha č.2). Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu nejpozději do 1 měsíce pokud není uvedeno jinak. Vyřezaná hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Vyklizování hmoty z místa zásahu proběhne bez použití mechanizace tak, aby nedošlo k poškození ponechaných dřevin. Velmi malá část hmoty z vyřezávek bude využita k tvorbě drobných zhutněných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele. Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C.

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu

Opatření bude prováděno v letech 2019 až 2022 ve vegetační sezóně, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci tj. v červnu až říjnu (termín se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti, bude na řešené ploše v daném roce uplatněno a jaká bude jeho účinnost). Postřik kořenových i pařezových výmladků po předchozí vyřezávce dřevin i případného náletu dřevin ze semenné banky bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích po předchozích vyřezávkách a náletu ze semenné banky na místech, která mají být zbavena dřevin. První aplikace tedy proběhne vždy na počátku časového rozmezí pro dané opatření. Po 30 dnech bude provedena druhá aplikace na dříve nezasažené jedince dřevin. Opatření prováděné v letech 2020 až 2022 bude prováděno až po druhé seči. Herbicid bude aplikován výhradně na listy likvidovaných jedinců tak, aby jím nebyly zbytečně zasaženy jiné rostliny.

Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou + následná aplikace herbicidu

Opatření bude prováděno v kombinaci s následnou šetrnou aplikací herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin. Mezi jednotlivými navazujícími zásahy bude časový odstup min. 30 dnů, tzn. aplikace herbicidu bude provedena nejdříve 30 dnů od dokončení předchozího ručního sečení. Použitá technologie je upřesněna u jednotlivých opatření.

Budou překosena místa s převahou nevhodných zmlazujících dřevin a invazních, expanzivních a ruderálních bylin. Ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Poměr ponechaných nekosených částí je uveden ve specifikaci zásahu (tab příloha č.2), přesné vymezení ploch bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací v závislosti na vývoji sezony a kvalitě provedení předchozích zásahů.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dnů od provedení seče. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích v MZCHÚ nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd. Plochy s výskytem *Calamagrostis epigejos*, *Arrhenantherum elatius* budou překoseny před jejich vymetáním nejpozději do 31.5.

Šetrná aplikace herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin bude prováděna na konci vegetační sezóny, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci, jako navazující zásah, nejdříve však 30 dnů od dokončení ručního sečení. Postřik kořenových i pařezových výmladků a semenáčů po předchozí vyřezávce a ručním sečení bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován vhodnou technologií (směrový rosič, bodová jehla apod.) výhradně na likvidované dřeviny s minimálním dotčením okolní vegetace. Rozsah a vymezení ploch určených k ošetření a ponechávaných bez zásahu bude určen při terénní pochůzce se zadavatelem

před zahájením prací. Práce bude převzata až po viditelném projevení (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) účinků herbicidu.

Sečení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

Použitá technologie je upřesněna u jednotlivých opatření. Účelem je odstranění stařiny bylin i travin (tzn. důsledné vyhrabání), odstranění živin, potlačení expanze i invaze dřevin redukcí zmlazení dřevin po předchozích vyřezávkách. Sečení, shrabání i odklizení bude prováděno vč. výmladků dřevin, které lze odstranit křovinořezem. Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dní seči. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích objednatele nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd. Termín seče bude v závislosti na kvetení nežádoucích druhů jako jsou *Calamagrostis epigejos*, *Solidago canadensis*, *Arrhenantherum elatius*, *Arctium sp.*, *Conium maculatum*, *Urtica dioica* apod., přičemž přesný termín seče bude pro jednotlivé roky upřesněn zástupcem objednatele v závislosti na průběhu vegetační sezony.


Při mozaikové seči, tj. ponechání části ploch bez zásahu, budou přednostně překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a rudерálních bylin. Naopak ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude před zahájením prací konzultováno se zástupcem objednatele. Poměr ponechaných nekosených částí je uveden ve specifikaci zásahu (tab Příloha č.2).

Číslo opatření:
LER-2017-004

Popis:

Odstranění nevhodných dřevin
bez odstranění pařezů

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

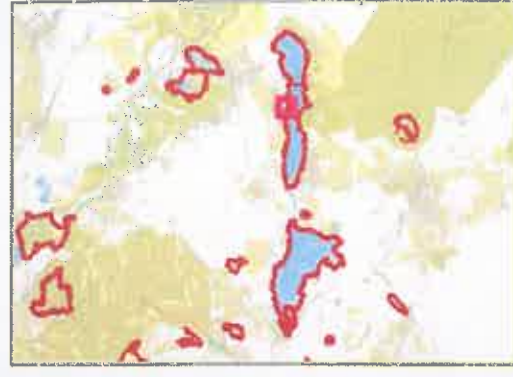


Číslo opatření:
LER-2017-006

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 25 50 75 m

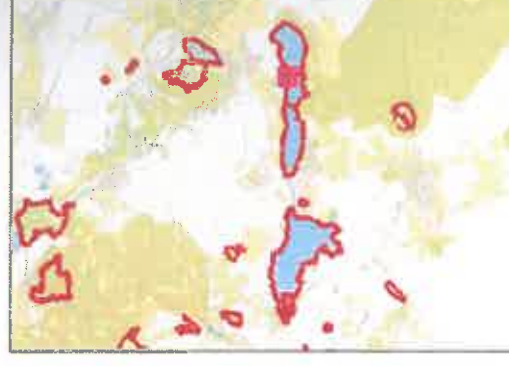


Číslo opatření:
LER-2018-004

Popis:

Odstranění nevhodných dřevin
bez odstranění pařezu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m

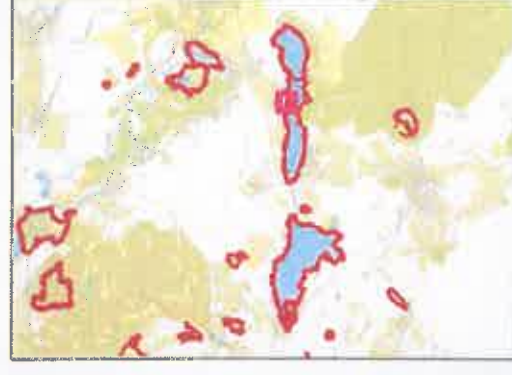

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadí: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015


Číslo opatření:
LER-2018-006

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR


0 25 50 75 m

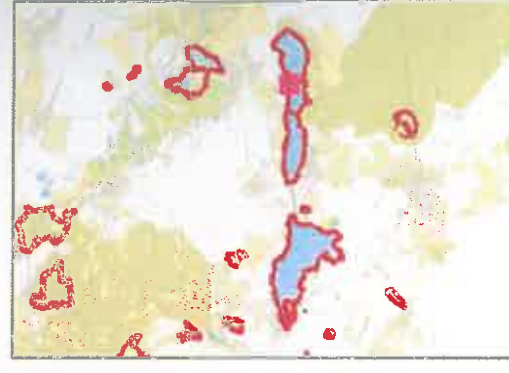

Číslo opatření:
LER-2019-004

Popis:
Likvidace invazních
a expanzivních rostlin
Applikace herbicidu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

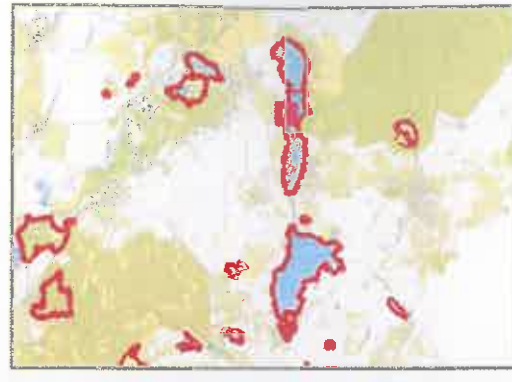

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sešavl: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015


Číslo opatření:
LER-2020-004

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m

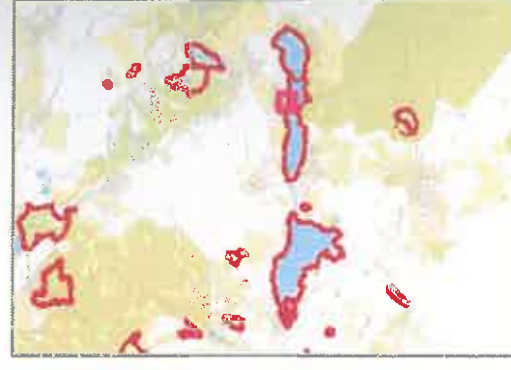


Číslo opatření:
LER-2020-006

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 25 50 75 m

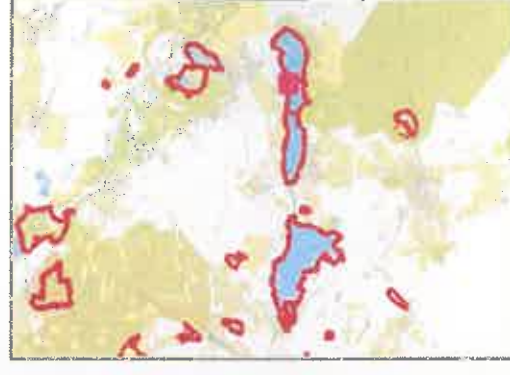

NPR Lednické
rybníky

NPR
Lednické
rybníky


Číslo opatření:
LER-2021-004

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m

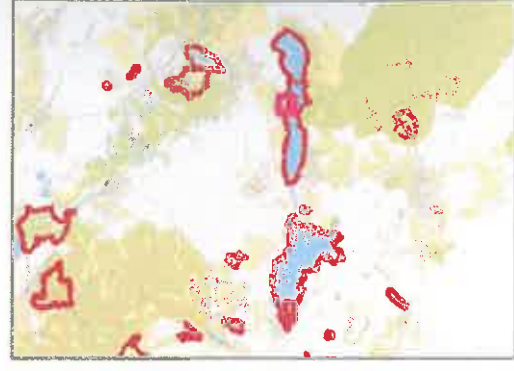

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2015




Číslo opatření:
LER-2021-006

Popis:

Sečení křovinofezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 25 50 75 m

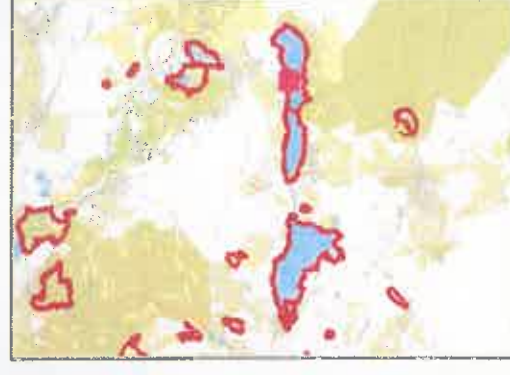

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadit: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2016


Číslo opatření:
LER-2022-004

Popis:

Sečení ručně vedenou sekačkou
(ruční shrabání a nakládání)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m

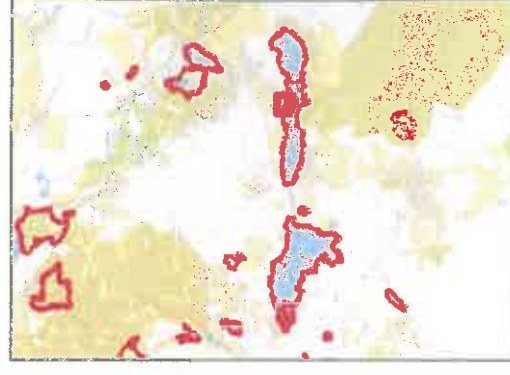

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 31.07.2017 11:49:02

Jméno a příjmení: **Otakar Pražák**
Datum narození: **20.01.1980**
Občanství: **Česká republika**
Sídlo: **Sladová 2375/2, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo osoby: **70928517**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Velkoobchod a maloobchod**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **29.08.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Břeclav**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]
– ČÁST [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika Části díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že Část díla¹

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přejímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.
Důvod nepřevzetí Části díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení Části díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatelům dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
-
-
- Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.
Důvod nepřevzetí díla:
-
-

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....

.....

Objednatel doporučuje uvolnit - Kč za zhotovení díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.
