



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: **09493/OPK/14**
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ing. Hana Chybová

Sídlo: Brněnská 342/16, 692 01 Mikulov

Zastoupený: Hanou Chybovou

Bankovní spojení: KB Brno, 19-9096170207/0100

IČO: 409 71 384

DIČ: neplátce

zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon: +420 774 581 161

E-mail: hana.chybova@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka SKO_J.

Specifikace díla je uvedena v příloze č.1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	SKO-2017-001			32 681,472
2. část	2018	SKO-2018-001			84 256, 92
3. část	2019	SKO-2019-001			30 638,84042
4. část	2020	SKO-2020-001			39 575,22
5. část	2021	SKO-2021-001			33 192,12
6. část	2022	SKO-2022-001			26 809,02
Cena celkem					247 153,594

Zhotovitel **není** plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".

3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 15.9.2022.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést části díla a předat je objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**

4.3 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.4 Místem plnění je Česká republika – CHKO Pálava – Přírodní rezervace Svatý Kopeček. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provádět části díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.3 Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.

5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.2 V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).

7.3 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

VIII. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.

- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 10.3** Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 – mapový zakres,

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5- -vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 03-08-2017


Objednatel



RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

V Mikulově dne 12.4.2014

Zhotovitel



Ing. HANA
CHYBOVÁ
Brněnská 342/16
692 00 MIKULOV
DIČ: CZ520999999
IČ: 40971394
Ing. Hana Chybová

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

-14-

Příloha č.1 dílčí zakázka SKO-J

Obecné požadavky na provádění opatření:

-Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na území Přírodní rezervace Svatý Kopeček na pozemku KN 2695 k.ú. Mikulov

-Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

-Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu

-u níže uvedených činností typu „Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez“ a „Sečení křovinořezem“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací

-náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez

Budou odstraněny všechna stadia invazních a expanzivních dřevin *Robinia pseudacacia*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*. Dále budou odstraněny především expanzivní a nevhodné druhy dřevin, bez zásahu zůstanou ponechány vhodné druhy dřevin či jejich skupiny různého stáří a zdravotního stavu, které budou vymezeny zástupcem objednatele před zahájením prací. Celkový poměr ponechaných dřevin je uveden ve specifikaci zásahu (tab. Příloha č.2).

Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. V případě snížené únosnosti terénu není možný vjezd mechanizací do chráněného území mimo běžně užívané cesty. Za naprostého sucha či zámrazu lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zachovalé části stepních společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele. Malá část hmoty (do 3,0 prm) z vyřezávek bude využita k tvorbě drobných zhutněných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele (umístění, velikost).

Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C.

Sečení křovinořezem

Opatření bude prováděno v kombinaci s následnou šetrnou aplikací herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin. Mezi jednotlivými navazujícími zásahy bude časový odstup min. 30 dnů, tzn. aplikace herbicidu bude provedena nejdříve 30 dnů od dokončení předchozího ručního sečení.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin a invazních, expanzivních a

Číslo smlouvy: 09493/ROPK/114

Dotační titul: OPŽP

rudерálních bylin. Ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Celkový poměr kosených částí (X%) je uveden ve specifikaci zásahu (tab Příloha č.2), přesné vymezení ploch bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací v závislosti na vývoji sezony a kvalitě provedení předchozích zásahů.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dnů od provedení seče. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích v MZCHÚ nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd. Plochy s výskytem *Calamagrostis epigejos*, *Arrhenantherum elatius* budou překoseny před jejich vymetáním nejpozději do 31.5.

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu

Následná aplikace herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin bude prováděna na konci vegetační sezóny, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci, jako navazující zásah, nejdříve však 30 dnů od dokončení ručního sečení. Postřik kořenových i pařezových výmladků a semenáčů po předchozí vyřezávce a ručním sečení bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude šetrně aplikován vhodnou technologií (směrový rosič, bodová jehla apod.) výhradně na likvidované dřeviny s minimálním dotčením okolní vegetace. Rozsah a vymezení ploch určených k ošetření a ponechávaných bez zásahu bude určen při terénní pochůzce se zadavatelem před zahájením prací. Práce bude převzata až po viditelném projevení (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) účinků herbicidu.

část zakázky	č.opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozměří, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	SKO-2017-001	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez	4,2554	1,8340796	odstranění náletu (do 10cm průměru kmene na fezní ploše patřezu),na cca 38% celkové rozlohy opatření	XI-II (31.3.2018)	20000	32681,472
						Celkem č.1		32681,472
část 2. (rok 2018)	SKO-2018-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VII (15.7.2018)	8000	20425,92
		Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	2,1277	šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 50% plochy	VIII-IX (15.9.2018)	30000	63831
část 3. (rok 2019)	SKO-2019-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VII (15.7.2019)	8000	20425,92
		Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	1,27682	šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 30% plochy	VIII-IX (15.9.2019)	7999,969	10212,92042
část 4. (rok 2020)	SKO-2020-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VII (15.7.2020)	8000	20425,92
		Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	0,63831	šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 15% plochy	VIII-IX (15.9.2020)	30000	19149,3
část 5. (rok 2021)	SKO-2021-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VII (15.7.2021)	8000	20425,92
		Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	0,42554	šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 10% plochy	VIII-IX (15.9.2021)	30000	12766,2
část 6. (rok 2022)	SKO-2022-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VII (15.7.2022)	8000	20425,92
		Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	0,21277	šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 5% plochy	VIII-IX (15.9.2022)	30000	6383,1
						Celkem č.6		26809,02
						Celkem		247153,5924

Číslo opatření:
SKO-2017-001

Popis:

Likvidace invazních
a expanzivních rostlin - výřezem


lokalizace opatření

hranice ZCHÚ

hranice ochranného pásma

pozemky AOPK ČR

0 40 80 120 m

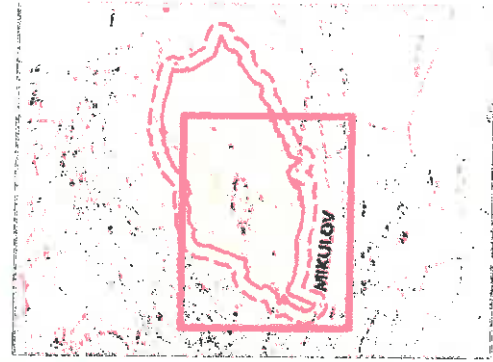

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2015
Zdroje:
GIS PR Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2015



Číslo opatření:
SKO-2018-001

Popis:

Likvidace invazních
a expanzivních rostlin

Sečení + Aplikace herbicidu


lokalizace opatření

hranice ZCHÚ

hranice ochranného pásma

pozemky AOPK ČR

0 40 80 120 m

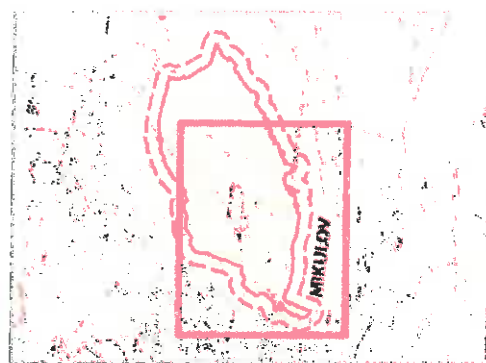

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavi: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
SKO-2019-001

Popis:

Likvidace invazních
a expanzivních rostlin

Sečení + Aplikace herbicidů

- lokalizace opatření
- hranice ZCHÚ
- hranice ochranného pásma
- pozemky AOPK ČR

0 40 80 120 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihlava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2015
Zdroje:
GIS RP Jihlava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2015

Číslo opatření:
SKO-2020-001


Popis:

Likvidace invazních
a expanzivních rostlin

Sečení + Aplikace herbicidu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 40 80 120 m

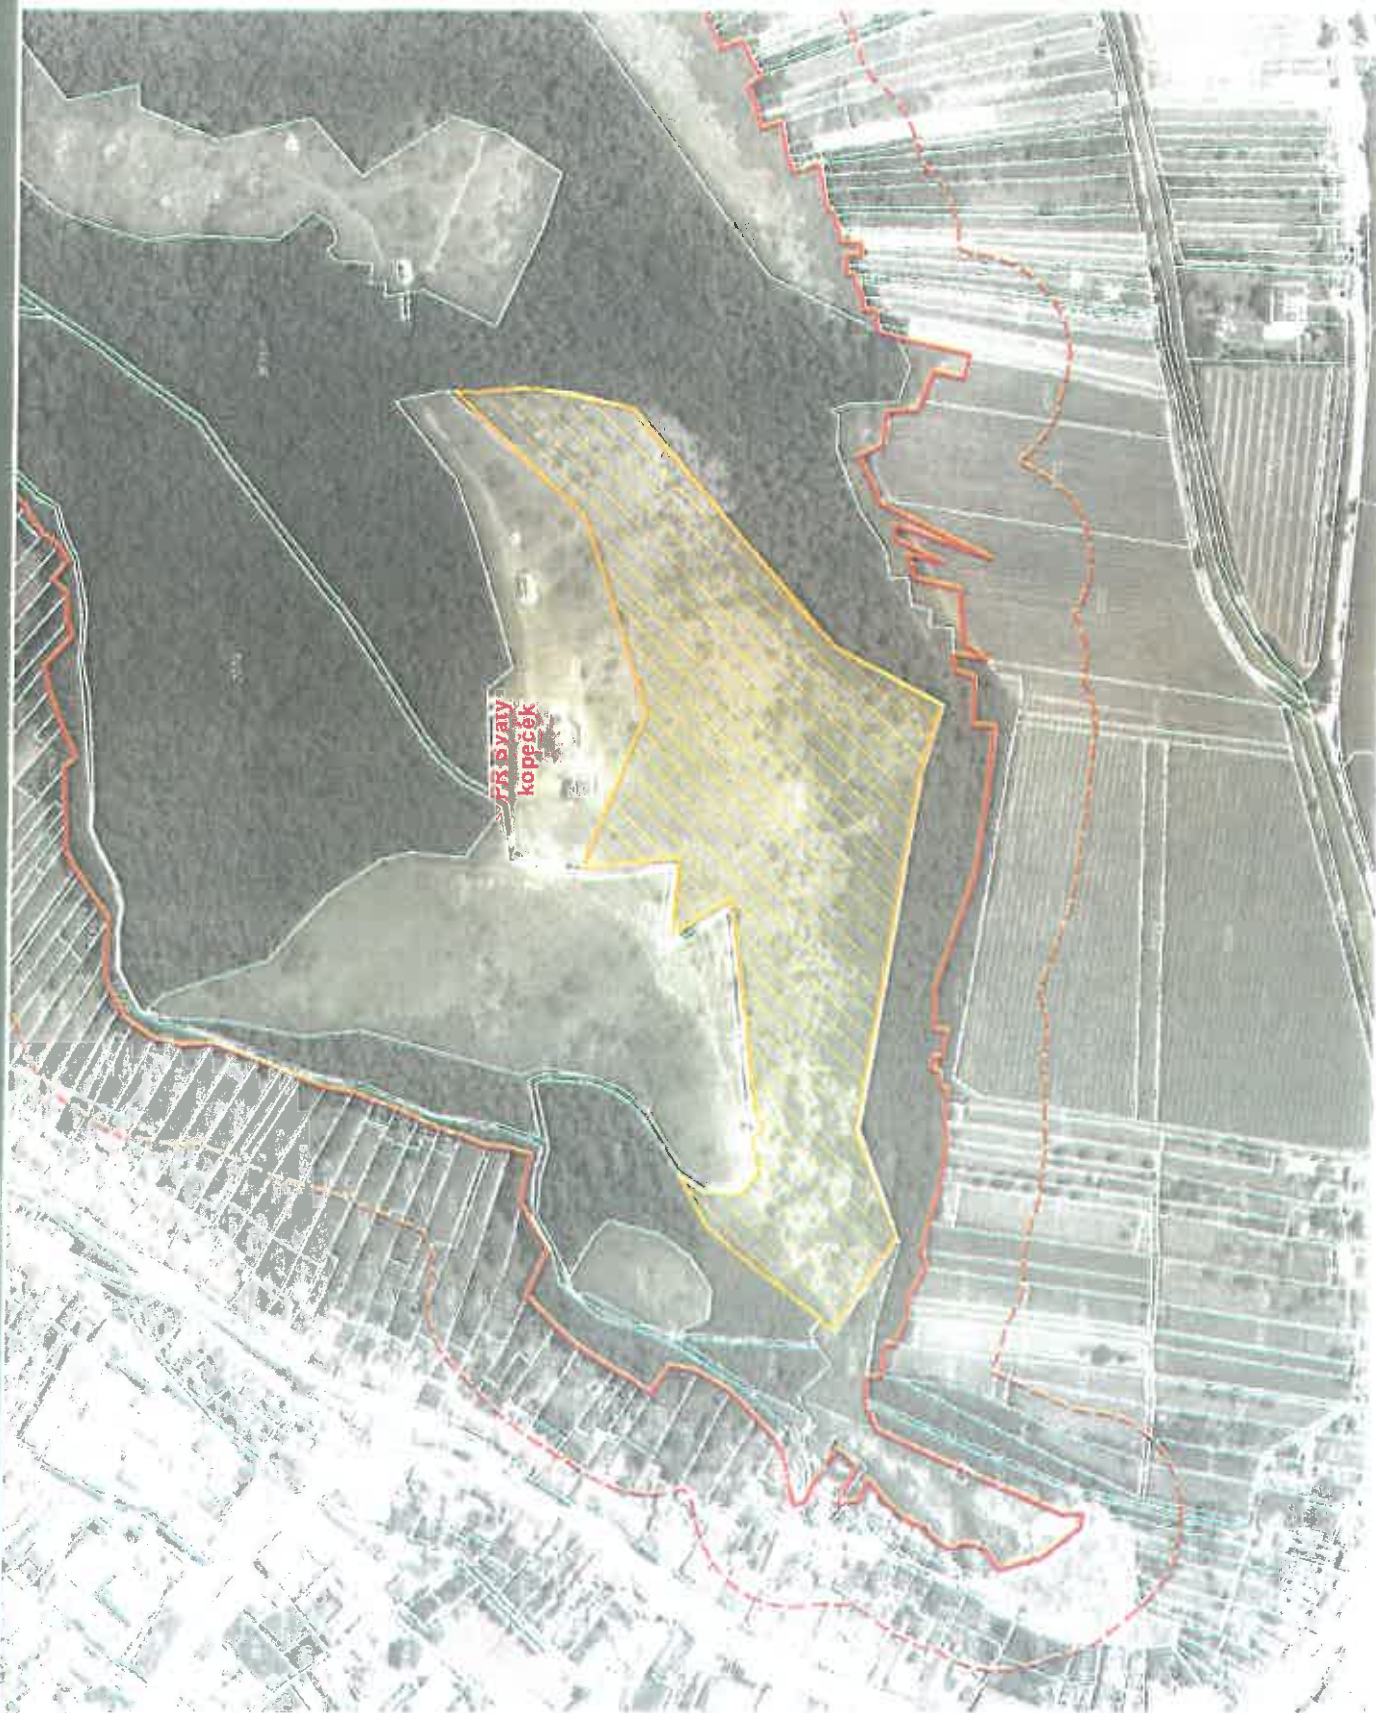

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřazení: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2015
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
SKO-2021-001

Popis:

Likvidace invazních
a expanzivních rostlin

Sečení + Aplikace herbicidu

lokalizace opatření

hranice ZCHÚ

hranice ochranného pásma

pozemky AOPK ČR

0 40 80 120 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sektor I. Zelená HEJKA
Blansko 2015
Zdroj:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015


Číslo opatření:
SKO-2022-001

Popis:


*Likvidace invazních
a expanzivních rostlin*

Sečení + Aplikace herbicidu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

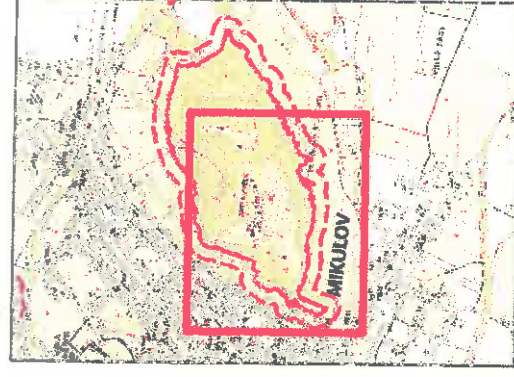

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortograf © GÚZK 2016

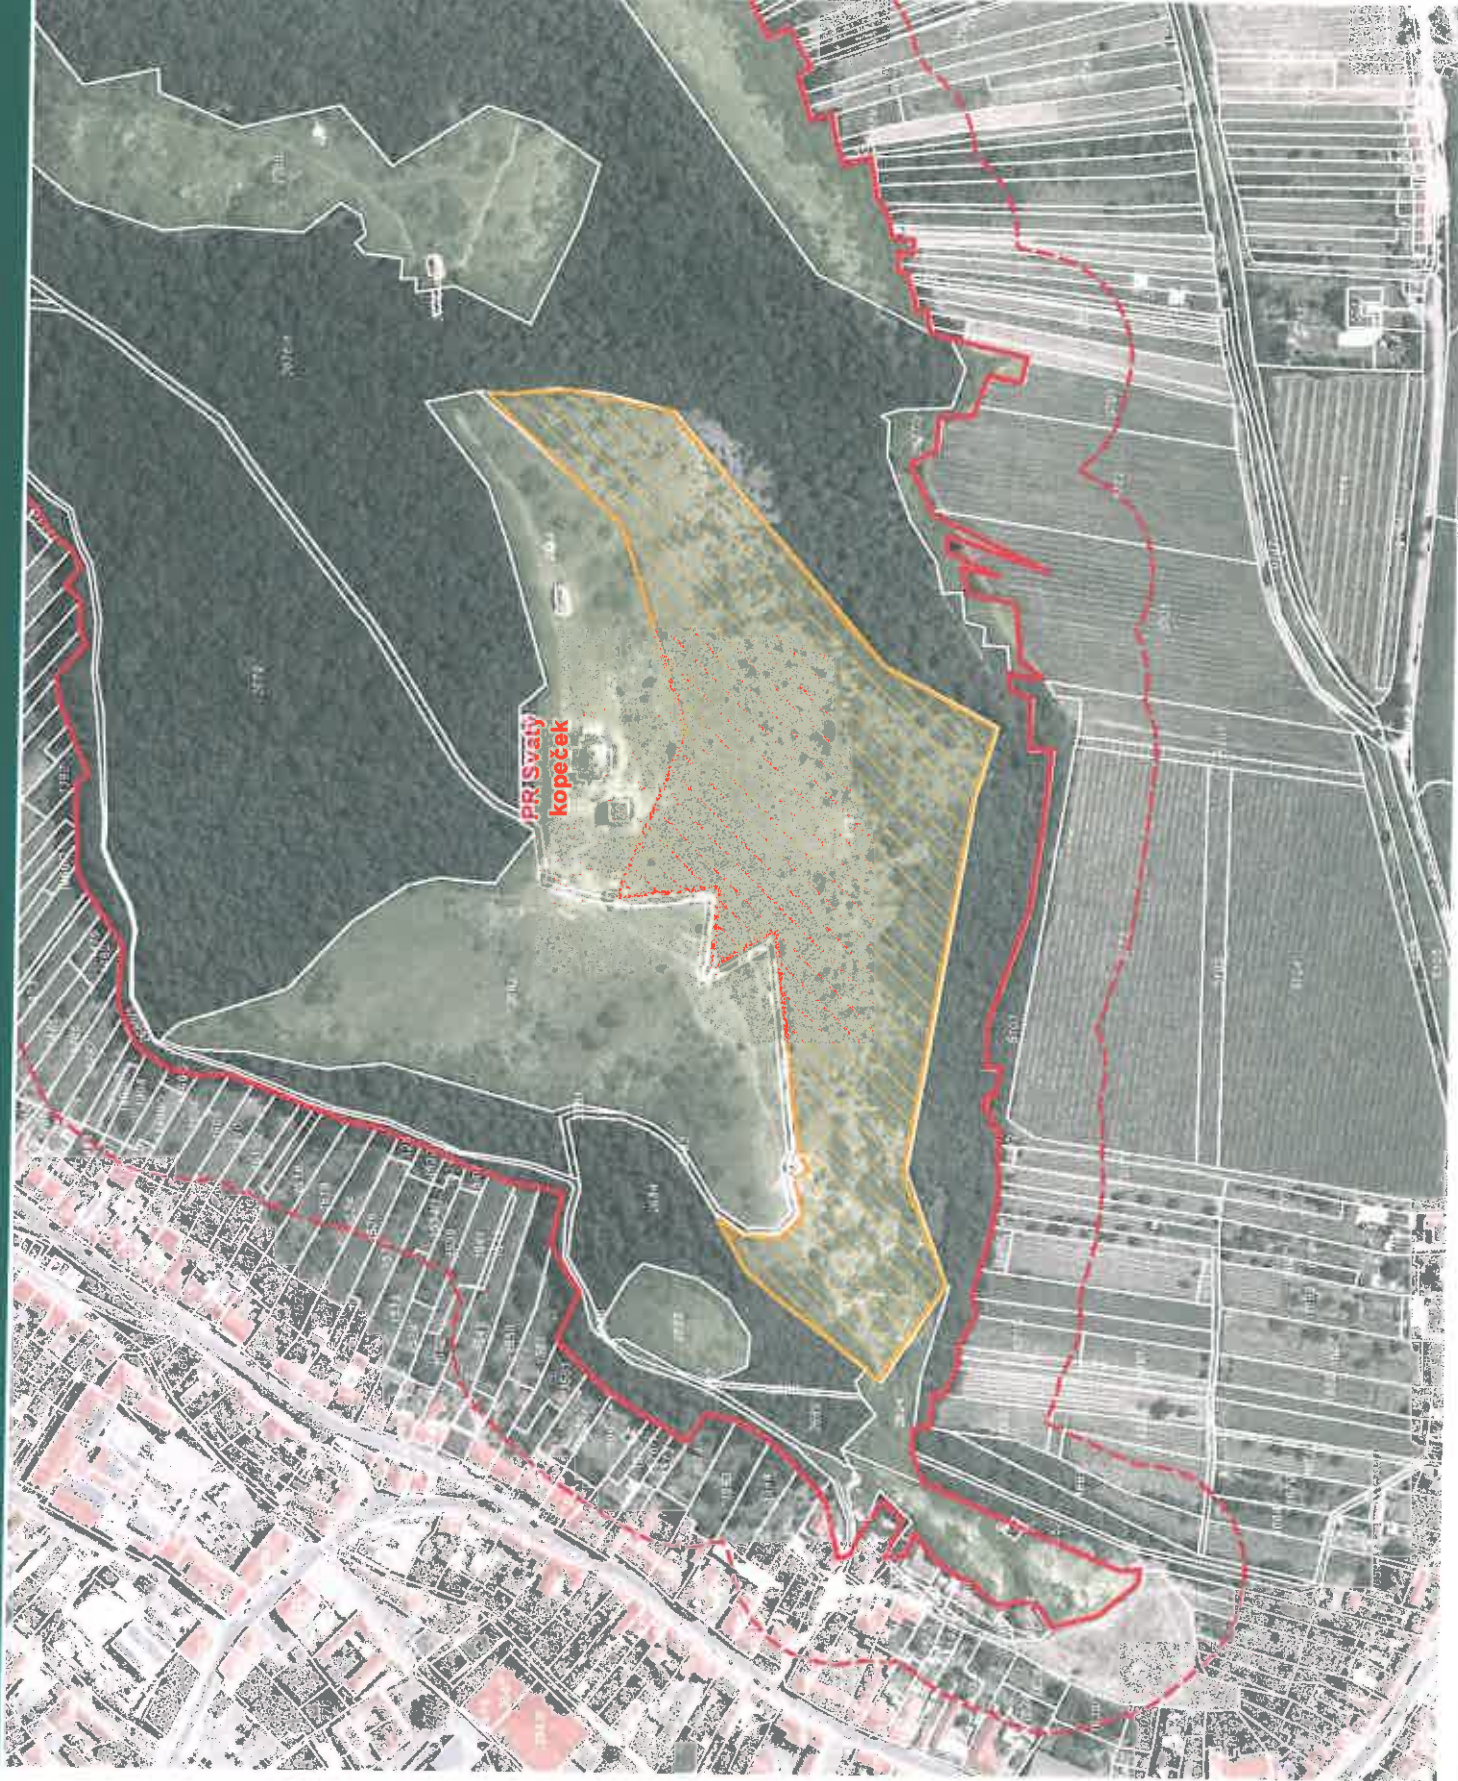

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 31.07.2017 09:15:18

Jméno a příjmení: **Ing. Hana Chybová**
Datum narození: **19.09.1957**
Občanství: **Česká republika**
Sídlo: **Brněnská 342/16, 692 01, Mikulov**
Identifikační číslo osoby: **40971384**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **23.03.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: **Ubytovací služby**

Adresa: **Brněnská 342/16, 692 01, Mikulov**

Identifikační číslo provozovny: **1006408452**

Zahájení provozování dne: **02.02.2017**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Mikulov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ“, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatелеm dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
-
-
- Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.
Důvod nepřevzetí díla:
-
-

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....

.....

Objednatel doporučuje uvolnit ,- Kč za zhotovení díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]
– ČÁST [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika Části díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že Část díla¹

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přejímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.
Důvod nepřevzetí Části díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení Části díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.
